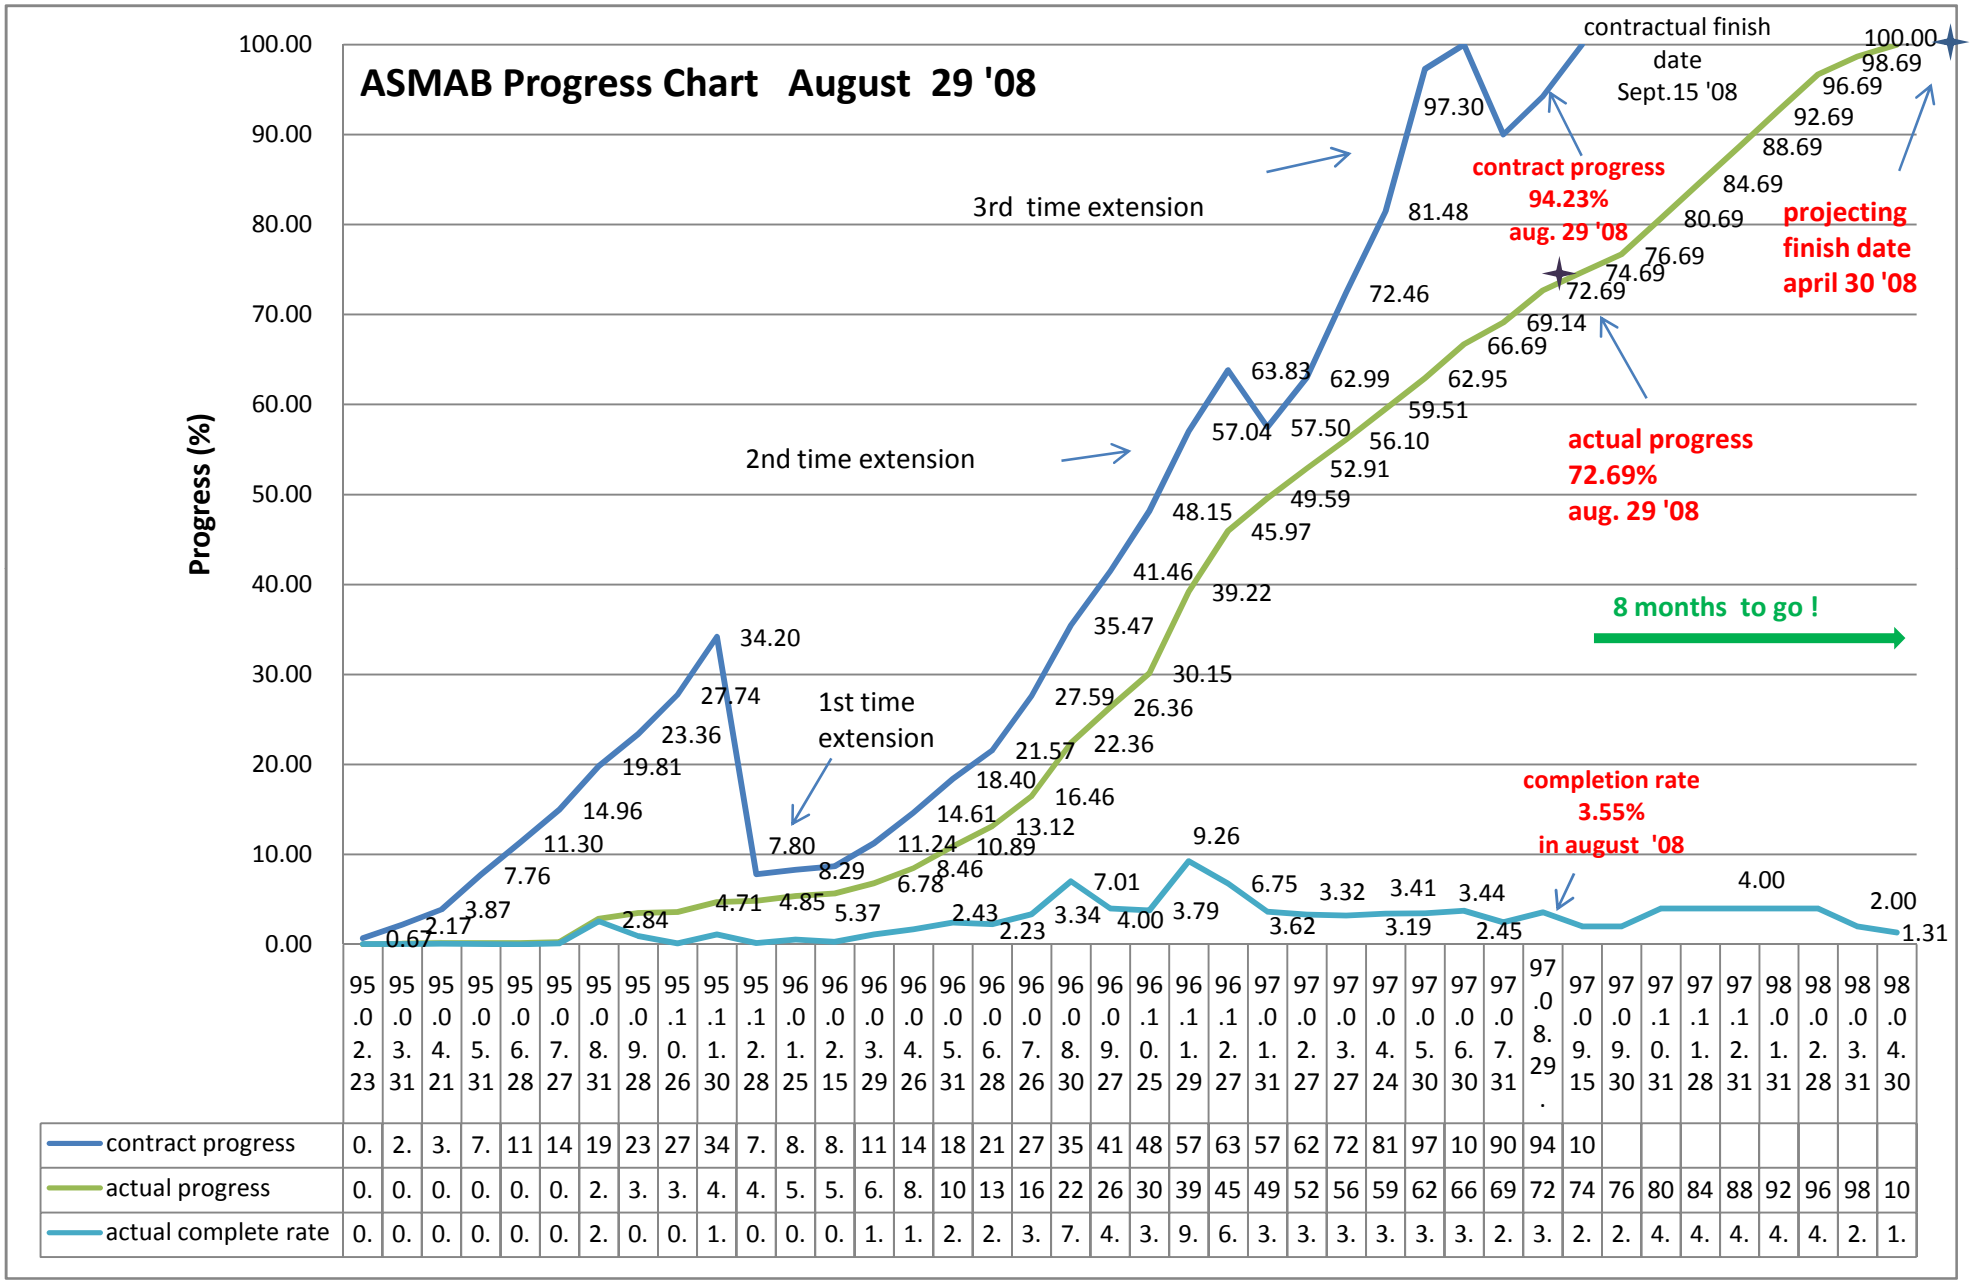

	95.02.23	95.03.31	95.04.21	95.05.31	95.06.28	95.07.27	95.08.31	95.09.28	95.10.26	95.11.30	95.12.28	96.01.25	96.02.15	96.03.29	96.04.26	96.05.31	96.06.28	96.07.26	96.08.30	96.09.27	96.10.25	96.11.29	96.12.27	97.01.31	97.02.27	97.03.27	97.04.24	97.05.30	97.06.30	97.07.31	97.08.29.	97.09.15	97.09.30	97.10.31	97.11.28	97.12.31	98.01.31	98.02.28	98.03.31	98.04.30
contract progress	0.	2.	3.	7.	11	14	19	23	27	34	7.	8.	8.	11	14	18	21	27	35	41	48	57	63	57	62	72	81	97	10	90	94	10								
actual progress	0.	0.	0.	0.	0.	0.	2.	3.	3.	4.	4.	5.	5.	6.	8.	10	13	16	22	26	30	39	45	49	52	56	59	62	66	69	72	74	76	80	84	88	92	96	98	10
actual complete rate	0.	0.	0.	0.	0.	0.	2.	0.	0.	1.	0.	0.	0.	1.	1.	2.	2.	3.	7.	4.	3.	9.	6.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	2.	3.	2.	2.	4.	4.	4.	4.	4.	2.	1.
